

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorgaan erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
 Van der Sweepstraat 3 bus 44
 2000 Antwerpen
 Tel. 03 216 28 90
 Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
 Clovislaan 15
 1000 Brussel
 Tel. 02 230 81 82
 Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____
 U. ref.: _____ **VERSLAG NR. 82/040827/02**

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Kijmpeelsesteenweg 244
Aarschot

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

STROOMLEVERANCIER: JE
 Ref.: _____ Teller nr. _____
 Index: _____

Datum van het onderzoek: 27/08/2004 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
 (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie: (Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzuuring): Type der lokalen: app 2

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type diff 40A/300mA

Type van de aardelektrode (tus) boren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 14; RA: 4 Ohm; Ri tot 200 MOhm

BESCHRIJVING:

zie bijgevoegde schema's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: <u>geen</u> <u>NOTA: bepalen door het handwerk, veiligheid: water en gas is nog te plaatsen</u>	PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
	gezien op
	de aangestelde van de stroomverdieler:
	naam: _____ handtekening: _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.


BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de één draads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27/08/2007 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ~~De installatie is niet conform.~~
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____



DE AGENT-ONDERZOEKER: _____
 pr. + naam + handtekening

De directeur, _____

APPARTEMENT_2 ZOLDERVERDIEPING

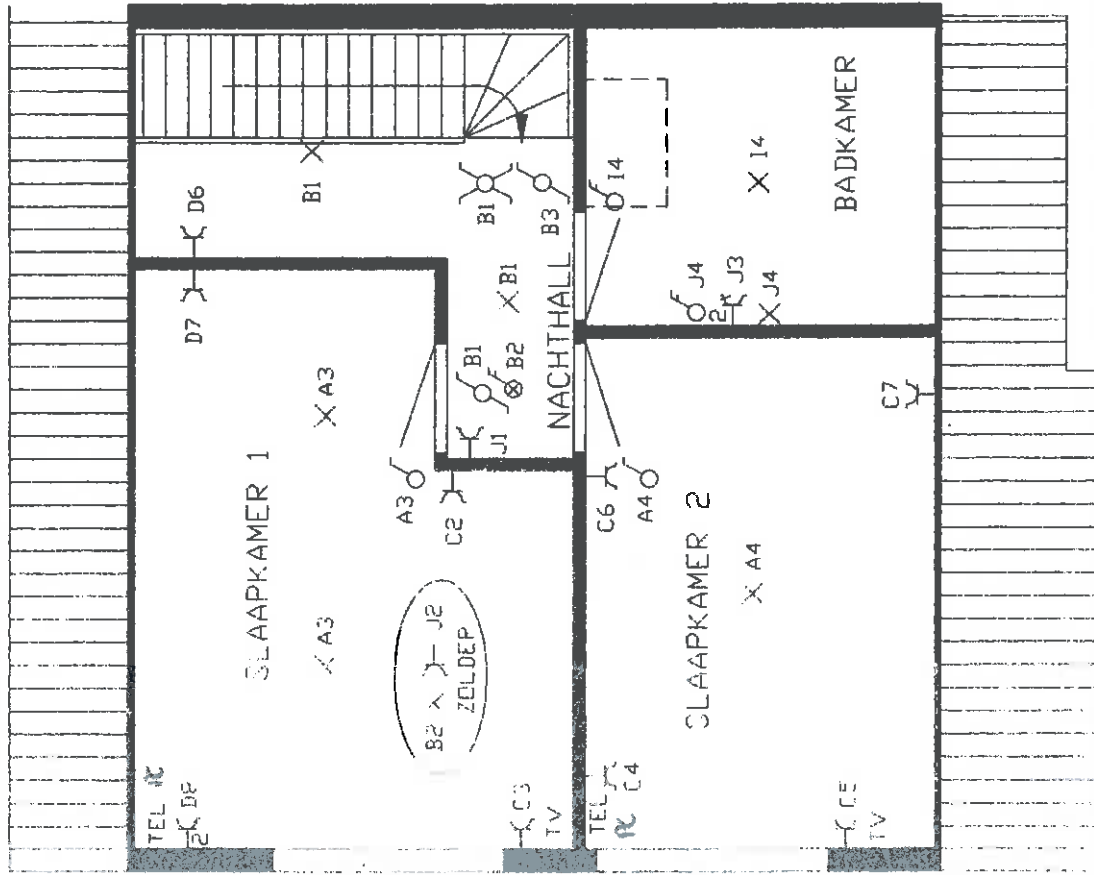

EERSTE VERDIEPING

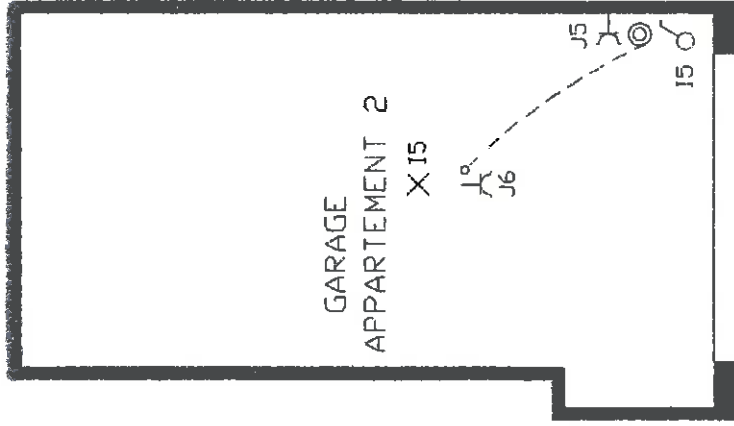

ELEKTR. DIERCKX D. BVBA.
BREMSTRAAT 4
2235 WESTMEERBEEK
TEL. 016/699004

D. Biendy

[Signature]
82 BTU
27/07/04

