


ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 151080611

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Leideneerbrek
Urmad 4

EIGENAAR : _____

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : ATV

Adres : Eggesteet 10

INSTALLATEUR : ES50 Vossela

Adres : _____

BTW of IK : 811 038 581

Datum van het onderzoek : 11/06/2008 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~ controle volgens :
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ABAB art. 262) (T.R. art. 281) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~overdracht eigendom~~ : Type der lokalen : Woning

Begin werken : Fundering ~~vóór~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~ na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning Ex 230 V

Bescherming van de aansluiting antenn 40 A max

Voedingskabel hoofdbord : Ex 10 mm²

Alg. schakelaar : type AB50N

/pe van de aardelektrode : lus - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~

Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 13 ; RA : 6 Ohm; RI tot 50 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren : _____

BESCHRIJVING :

Die sleemo's

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : geen

notie kinder en badkamermeubelen op lijkplaat

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers
naam :

handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT


- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/06/2008 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening



RM. 382-03/2007

De directeur,


Indeling schuifkast:

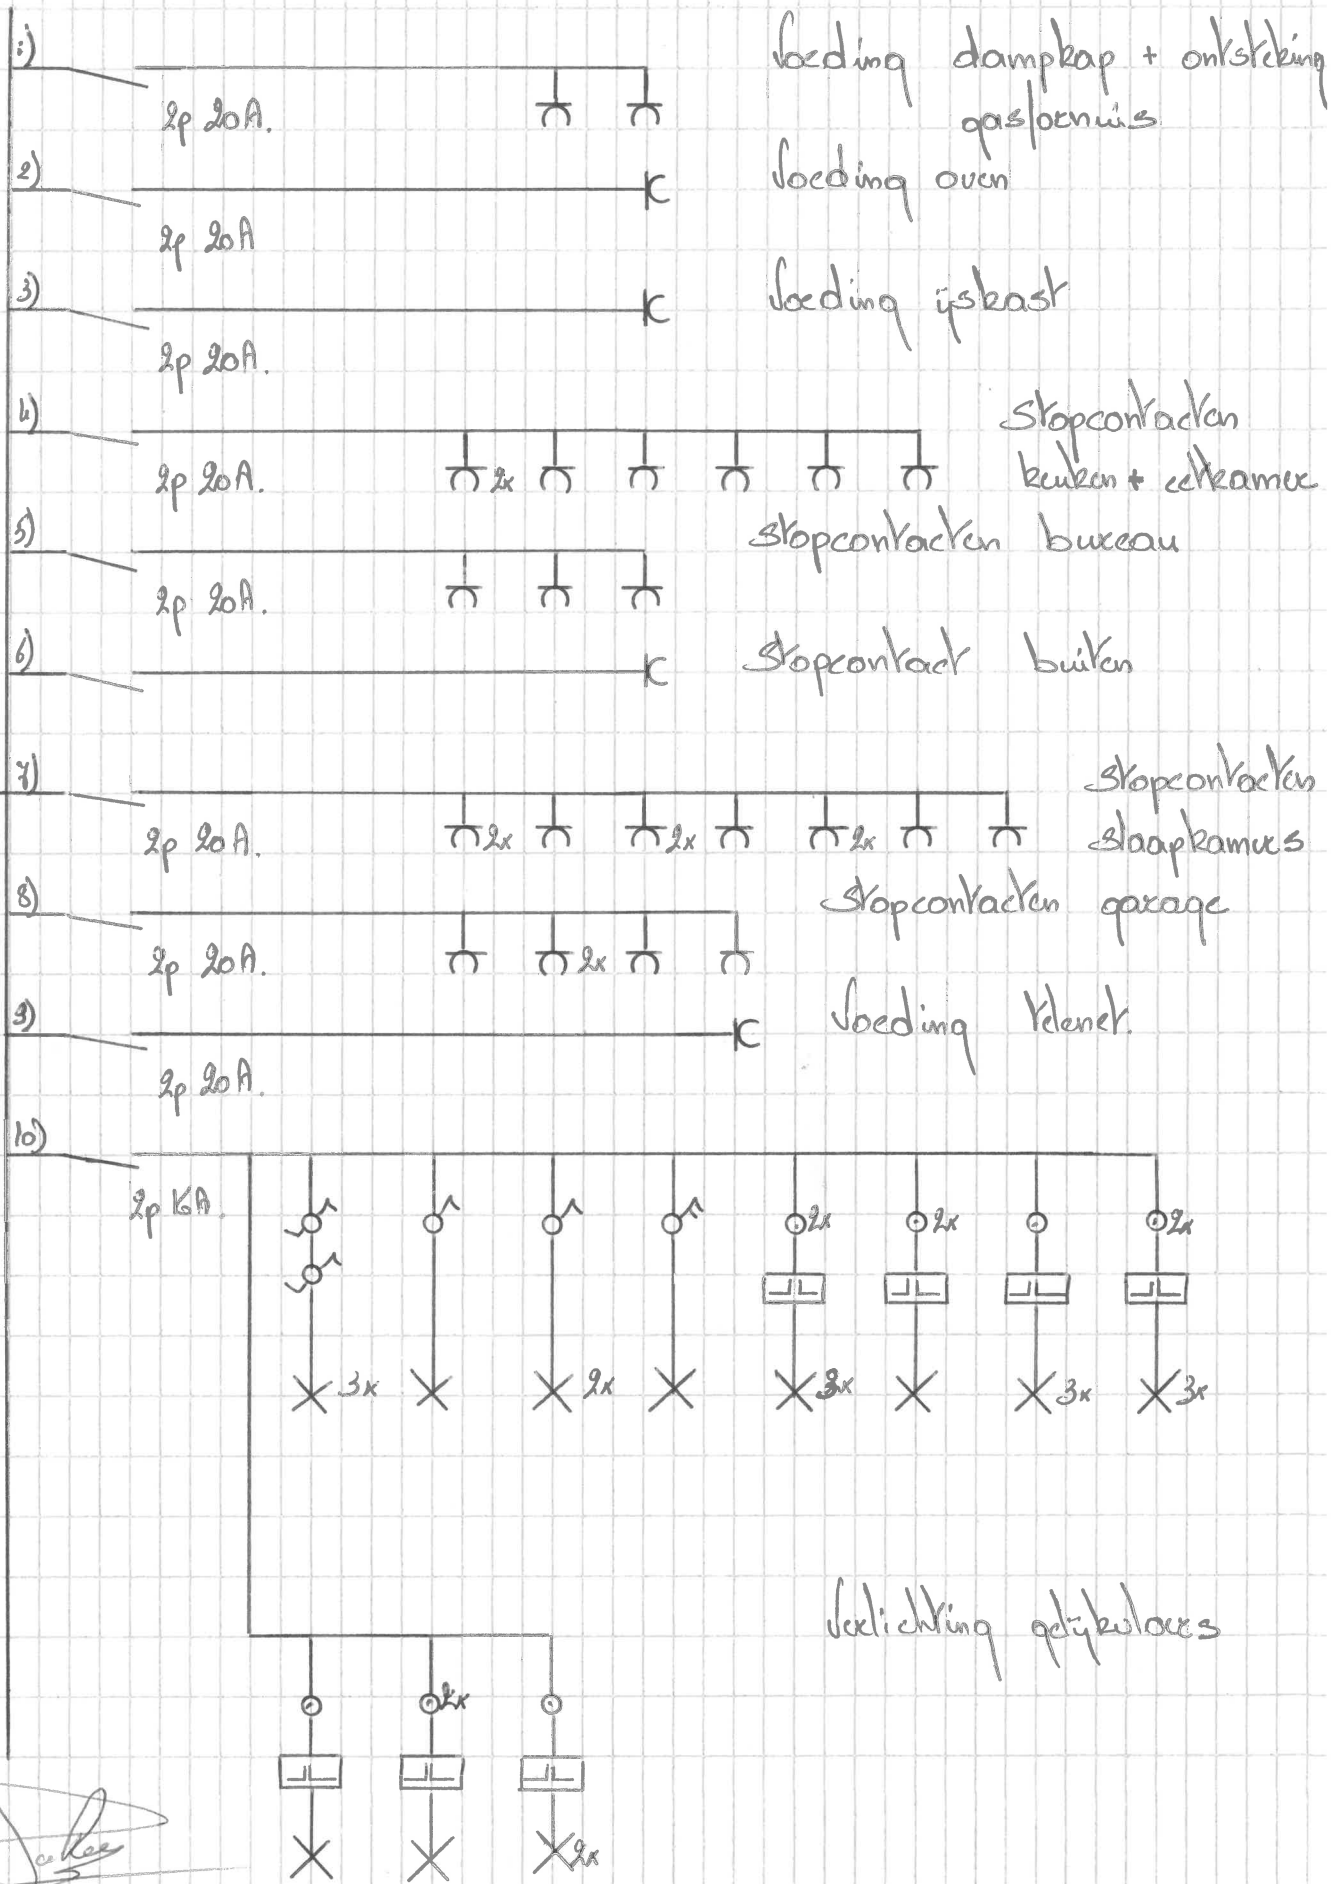

Inndeling reberingskast.

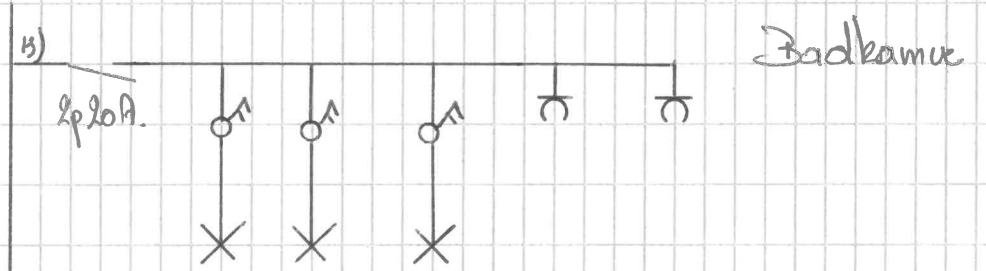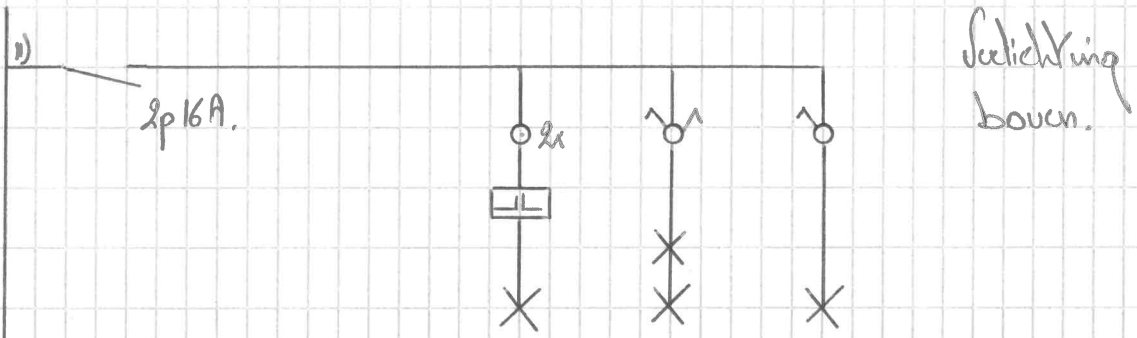

2p 40A.
300mA.

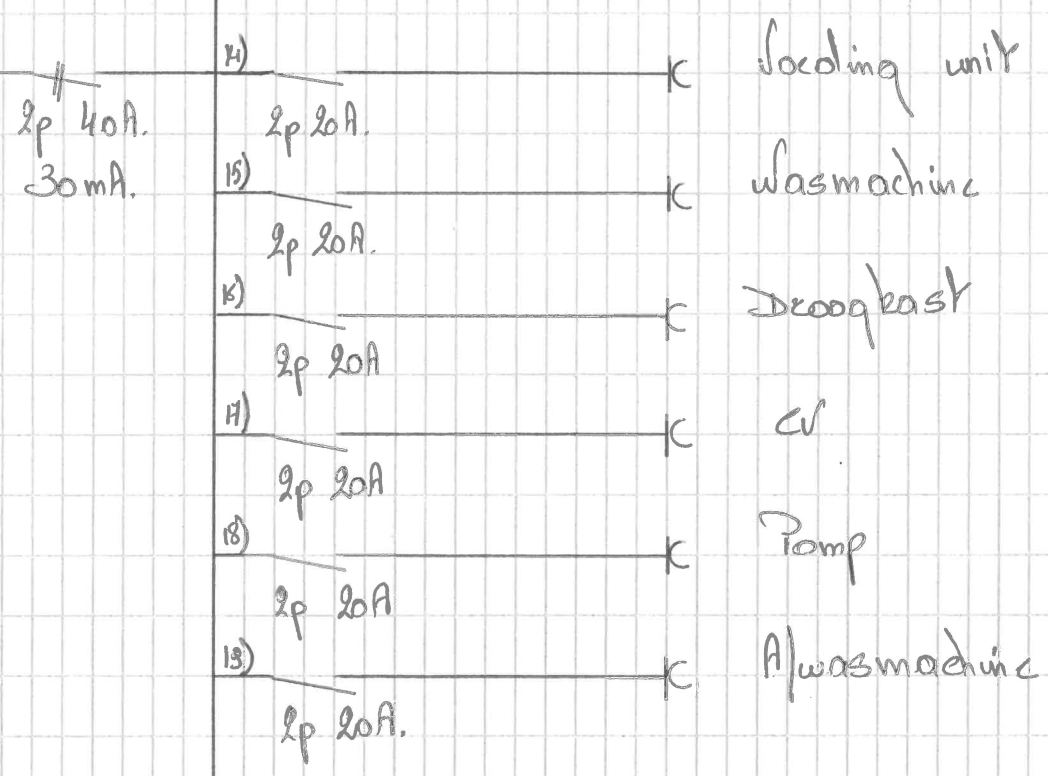

Jaeger

Indeling zekeringskast

1. Voeding dampkap en ontsteking gasfornuis
 2. Voeding oven
 3. Voeding ijskast
 4. Stopcontacten keuken en eetkamer
 5. Stopcontacten bureau
 6. Stopcontact buiten
 7. Stopcontacten slaapkamers
 8. Stopcontacten garage
 9. Stopcontacten telenet
 10. Verlichting gelijkvloers
 11. Verlichting verdieping
 12. Voeding poort
 13. Voeding badkamer
 14. Voeding unit
 15. Voeding wasmachine
 16. Voeding droogkast
 17. Voeding CV
 18. Voeding pomp
 19. Voeding afwasmachine
-

